

Приложение 1  
к распоряжению Министерства  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 №13

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Министерства территориальной  
политики Московской области  
от 16.10.2023 №13)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Щёлково.

Наименование проекта: «Проведение ремонта кровли, помещений, веранд, закупка МАФов  
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
средняя общеобразовательная школа №13 им. В.А. Джанибекова  
городского округа Щёлково (структурное подразделение детский сад «Рябинушка»)»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрез источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средств а областн ого бюджет а	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населен ия*	Всего	Средств а областн ого бюджет а	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
3 000 000,00	2 262 000,00	708 000,00	30 000,00	2 145 226,00	1 610 990,22	504 235,78	30 000,00	2 136 591,92	1 610 990,22	504 235,78	21 365,92	Договор заключен на меньшую сумму по результатам конкурсных процедур. Образовалась экономия денежных средств в сумме <b>863408,08</b> руб. Проект реализован, оплачен

\* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект \_\_\_\_\_ реализован своевременно \_\_\_\_\_  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
нет \_\_\_\_\_

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - \_\_\_\_\_ 09.09.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - \_\_\_\_\_ 02.12.2024 г.

5. К отчету прилагаются на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

\_\_\_\_\_ Смирнова О.В. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Булгаков А.А. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (подпись)



Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №13 им. В.А. Джанибекова  
городского округа Щёлково  
(структурное подразделение: детский сад «Рябинушка»)*

141104, Московской обл., г.о. Щёлково, ул. Беляева, стр. 12

т. 8(496) 259-97-10 E-mail: shel\_ds34@mosreg.ru

## ЗАКУПКА ПЕСОЧНИЦ 2024 год



*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №13 им. В.А. Джанибекова  
городского округа Щёлково  
(структурное подразделение: детский сад «Рябинушка»)*

141104, Московской обл., г.о. Щёлково, ул. Беляева, стр. 12

т. 8(496) 259-97-10 E-mail: shel\_ds34@mosreg.ru

## РЕМОНТ ВЕРАНД 2024 год

До ремонта



После ремонта



*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №13 им. В.А. Джанибекова  
городского округа Щёлково  
(структурное подразделение: детский сад «Рябинушка»)*

141104, Московской обл., г.о. Щёлково, ул. Беляева, стр. 12

т. 8(496) 259-97-10 E-mail: shel\_ds34@mosreg.ru

## РЕМОНТ КРОВЛИ 2024 год

До ремонта



После ремонта




*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №13 им. В.А. Джанибекова  
городского округа Щёлково  
(структурное подразделение: детский сад «Рябинушка»)*

141104, Московской обл., г.о. Щёлково, ул. Беляева, стр. 12

т. 8(496) 259-97-10 E-mail: shel\_ds34@mosreg.ru

## РЕМОНТ ПРАЧЕЧНОЙ 2024 год

До ремонта

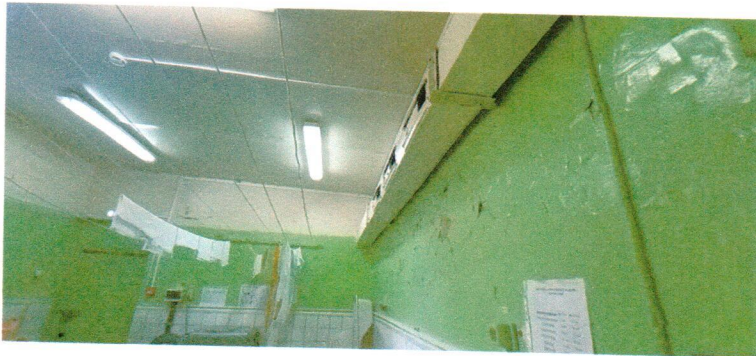

После ремонта

